新名神高速道路四日市東工事に関するニュースを月1回のペースで更新致します。

新名神四日市東工事ニュース

かわら版

第　3　号
平成25年 4月 15日　発行
株式会社大林組
新名神四日市東工事事務所

平素は新名神高速道路建設事業には格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
四日市JCTにて、新名神高速道路四日市東工事の作業を実施致します。
作業内容は、宇奈川の切廻し工事、BランプP3橋脚において土留工・掘削工、
BランプP4橋脚においてボーリング調査を行います。現場作業へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

4月の作業内容及び作業場所

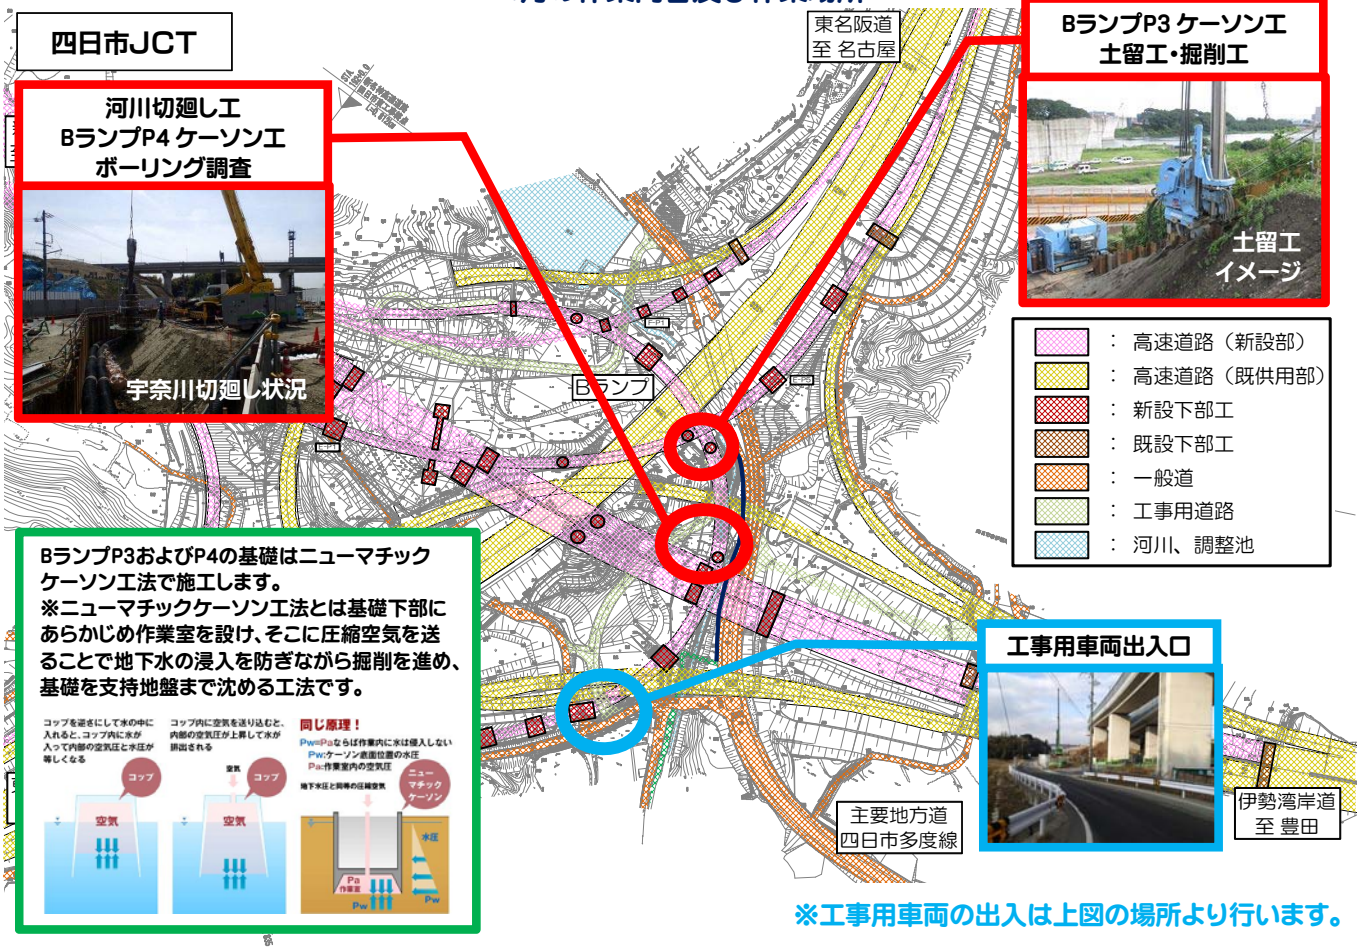

BランプP3およびP4の基礎はニューマチックケーソン工法で施工します。
※ニューマチックケーソン工法とは基礎下部にあらかじめ作業室を設け、そこに圧縮空気を送ることで地下水の浸入を防ぎながら掘削を進め、基礎を支持地盤まで沈める工法です。

※工事用車両の出入は上図の場所より行います。

・事務所が新しくなりました!!

住所:〒511-0937三重県桑名市志知字若ノ田406番
TEL:0594-87-7440　FAX:0594-87-7441

工程表

工種	4月 中旬	4月 下旬	5月 上旬
河川切廻し工	河川切廻し工		
BランプP3 ケーソン工		土留工	掘削・アンカー工
BランプP4 ケーソン工		ボーリング調査	送気設備設置

宇奈川の切廻し工事完了後、橋脚の工事へ移ります。

・職員紹介

4月より赴任した職員です。
どうぞよろしくお願いします。

工事長

森　恒一

土木係

浅井 睦

・現場ホームページ

4/1より現場HPを開設しました。
かわら版や現場写真を掲載しています。

※URLは下記に示しております。

住所:〒511-0937三重県桑名市志知字若ノ田406番　TEL:0594-87-7440　FAX:0594-87-7441
現場HP:http://www.obayashi.co.jp/civil/yokkaichihigashi/

発注者	中日本高速道路株式会社 名古屋支社 四日市工事事務所	NEXCO 中日本	施工者	株式会社大林組 新名神四日市東工事事務所	OBAYASHI
